官网智能客服：现在能做什么

给项目负责人的核对报告 | 代码核对、线上烟测、UI 覆盖和落地顺序

> 当前仍是 Phase 1 的受限知识问答，尚未升级为会搜产品、比较和准备询盘的完整客服。
> 本轮两个基础公司 / OEM 问题均未得到答案，先后进入不可用状态；应先恢复可用性与明确反馈。

四个直接结论

- “答不了也要回应”应由产品和系统保证。缺知识、超时和故障需要不同反馈，不能让买家面对空白等待。
- 多步工具调用、产品卡片、比较、询盘预填已经有 Phase 2 设计；主要能力尚未实现和合并。PR #59 仍为 OPEN。
- 基础聊天面板、引用、Stop 和故障表单入口已有代码；完整的等待、恢复、历史、产品与操作状态 UI 还没做好。
- 公开网页检索可以作为受控工具考虑。模型负责判断何时需要查，系统负责限制来源、资料和动作权限。

当前能力快照


能力	当前结论
公司 / OEM 知识问答	代码和历史部署已有；本轮基础问答失败，不能称当前可用性已验收。
实时产品检索 / 模糊选品	官网助手尚未接入；不能把网站有商品等同于助手能查目录。
循环调用工具 / 自定义动作	已规划受限工具循环；当前运行默认工具次数为 0。
公开网页搜索 / 浏览	未接入。在线模型与知识库调用不等于公开网页检索。
正式询盘后的 Sales 自动化	另一个工作流，近期完成权限与持久任务查询；未上线，尚未接完来源签发与生成发送。

本轮是调查和材料交付，没有修改产品代码、合并他人分支或开启线上功能。

线上实测：等待和失败都不够清楚


实测日期 2026-10-28，以下是实际页面，不是产品原型

在 apex 和 www 两个入口各问一个基础问题。www 提交约 51 秒后复查，仍只有问题气泡，输入框禁用，没有明确进度。后续复查已进入不可用状态。本轮 2 个烟测不能当作模型准确率统计。

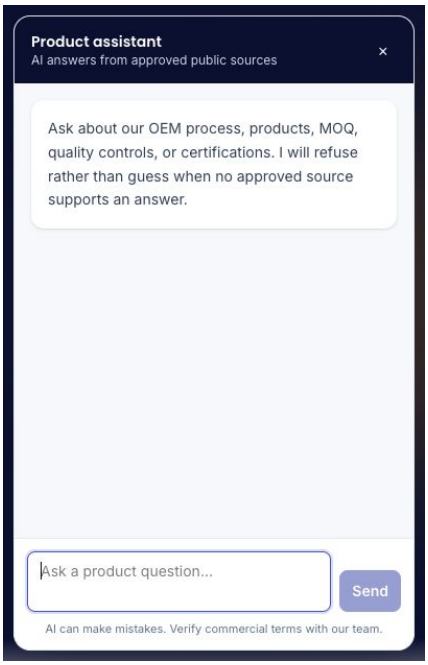


初始状态

刷新重开后只显示欢迎语，上一轮可见消息没有恢复。

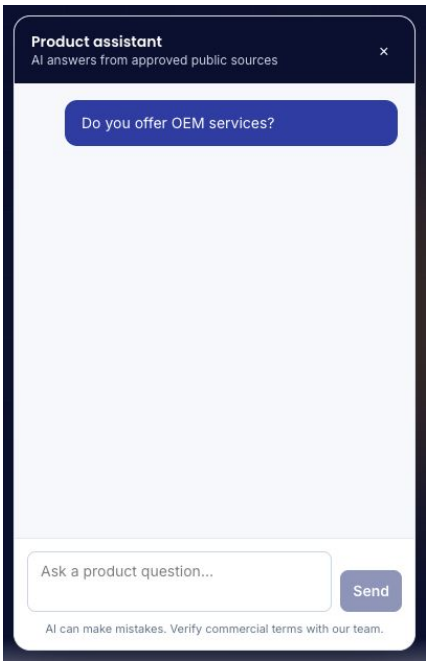

等待状态

Do you offer OEM services?
17:20:38 JST 提交；17:21:29 复查仍无回答。

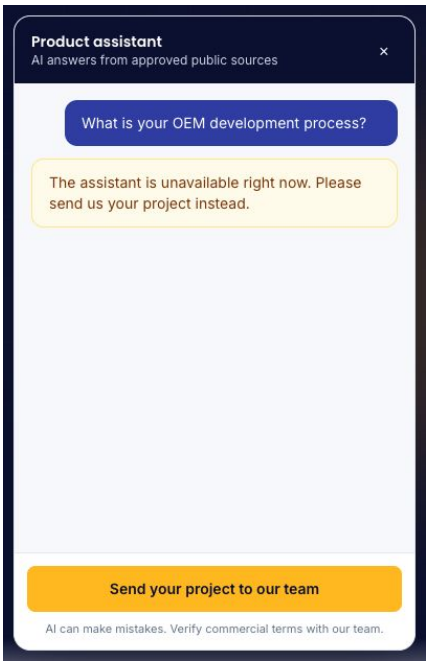

故障状态

最终只给“服务不可用”和原询盘入口；输入区被替换。

接口与证据

核对项	本次观察
实际前端资源	AssistantWidget.PvdNAv7f.js，仍含旧版通用不可用提示。
服务进程健康	实际 bundle 中的 BFF 地址 /api/ai/healthz 返回 200。
服务就绪	同一 BFF 的 /api/ai/readyz 在约 10.9 秒探测内未返回。

结论限于这次观察：服务进程活着不代表能正常回答。没有进入私网排查，不能据此断言数据库、网络或模型哪一层是最终根因；也没有成功的知识库外问题实测可作为拒答验收。

UI 状态：有基础面板，完整体验未完工

“源码存在”“本次实测”“PR 待合并”“仅规划”分别标明

状态 / 屏幕	当前状态	判断
欢迎、输入、打开关闭	源码已有，线上可见	基础面板成立。
提交中 / 排队中	反馈不足，已复现	busy 会禁用输入，但提交阶段没有清楚的进度和应用层截止。
正在查来源 / 生成中	旧版仅有省略号；PR 有改进	PR #59 增加 Checking approved sources，尚未合并；也不能单独解决提交阶段等待。
正常回答、引用链接	源码已有	本轮没有成功答案，不写成线上成功验收。
缺知识 / 无依据	通用失败处理	knowledge_empty 等错误会把 UI 设为 unavailable；缺少友好澄清和继续问的路径。
服务失败	源码已有，线上复现	显示项目表单链接；没有形成清楚的重试和保留问题体验。
Stop / 取消	源码已有，范围有限	只有进入 streaming 后出现；提交网络阶段没有同等的取消能力。
刷新 / 跨页面恢复历史	未完成	页面重开消息数组为空，key 存在不等于历史已画出来。
产品卡片 / 对比表	Phase 2 规划	Stage C6，没有在官网完成。
“这个产品”页面上下文	Phase 2 规划	A5 / C7，不能只改提示词代替页面和产品身份接线。
询盘预填 / 客户确认	Phase 2 规划	Stage D；原表单可复用，但聊天尚未联动。
真人排队 / 接管 / 退回 AI	后续设计	没有现成的完整访客与运营界面。
网页检索 / 工具执行状态	未接入	需同时有工具后端、结构化事件与 UI。

现有 AssistantWidget 单测主要检查自动滚动等源码结构，不足以证明全套聊天状态和客户旅程都已验收。

“更聪明、能做事”的设计到哪了

Phase 2 目标明确；当前 PR 主要是修上下文、回答归属和等待展示

> 受限工具循环已经在 PLAN / ADR-003 里：模型提出查询，服务器执行固定工具，把结果交回模型，最多 4 次调用；再验证事实和渲染 UI。官网当前没有这条执行链。

动作	现有可复用能力	助手接线状态
搜索与推荐产品	匿名公开产品 API、已有目录	Phase 2 B / C 待实现。
读取详情、比较方案	产品批准详情和现有产品页	详情工具、卡片、比较块待实现。
继续追问缺少的需求	模型理解 + 会话上下文	要修上下文，再加受控的需求事实和澄清行为。
准备询盘 / 报价申请	现有 OEM / 单品询盘表单	只预填需求，买家确认提交；聊天联动待实现。
发送邮件 / 承诺价格	后续 Sales 与审批发送模块	不属于当前官网助手权限，不能从聊天直接越过。

两处会直接影响体感的旧实现

- worker 先把整段回答留在服务器，直到最终引用检查通过才发布，所以并不是即时逐字输出。Stage X 才计划“先检索来源、再真正流式生成”。
- 当前主干上下文查询仍取最早 30 条，再组装模型上下文；长对话可能丢掉最新问题。PR #59 已包含相关修复，但仍未合并。该项是源码发现，不是本轮长对话复现。

自定义动作的实际含义

现有规划允许扩展一组由服务器登记、限制参数和权限的工具，尚不是一个已交付的“后台任意配置动作”平台。先做搜产品、看详情、比较和预填这类低风险动作；正式提交、发送和商业承诺仍走明确确认。

联网可以做，但要分清事实归属

建议方案，尚未作为已实现功能或已批准技术变更

模型可以判断当前问题需不需要外部信息。系统应决定能访问哪些工具和来源，不能把外部网页里的指令变成执行权限。官网后端目前已经通过网络调用模型和知识库；缺少的是公开网页检索 / 浏览工具。

信息类型	建议来源与规则
本公司产品、MOQ、参考价、认证	以本网站批准产品数据和公司知识为准；提交或审核前实时复核，保留实际依据。
行业常识、公开趋势、术语	可通过受控只读网页检索补充，标为外部参考，给出来源与时间，不把它说成公司的承诺。
问候、澄清、说明能力边界	可以自然回应或用可靠模板，不应因为没有一条商业来源就变成“机器人不可用”。

落地时应保留的系统规则

- 工具地址、凭据和客户身份由服务器固定；模型只提供受限的查询参数，不直接拿 DB、邮箱或任意 URL 抓取权限。
- 对外查询不携带买家的邮箱、联系方式或整段私有对话；外部内容作为资料，不能覆盖系统授权规则。
- 网页结果与公司事实分开显示；无可靠来源就说明无法确认，再给澄清、产品页或联系销售的下一步。
- 设置调用次数、时长和成本上限；工具失败有可理解的反馈，不能回退为无约束瞎答。

> 建议先解决服务可用、等待和恢复，再接实时产品工具。外部网页检索可以作为后续独立能力，不需要为此推翻整个客服或取消现有安全门禁。

依据：Anthropic 的工具与工作流模式支持按任务组合检索和工具；OWASP 指出外部内容可能携带间接提示注入，应由程序限制权限并验证结果。参考链接见最后一页。

官网助手与 Hermes Sales 怎么衔接

两条职责连续协作，不能把后台授权进度当成前端智能升级

部分	负责什么	当前进度
官网智能客服	接待、澄清、公开产品查询、准备询盘	Phase 1 有限问答；Phase 2 工具和 UI 未落地。
Channel 正式询盘	保存 OEM / 单品 / 客服确认提交的业务事实	已有表单和记录；统一可靠交接、完成核验及授权签发待补。
Hermes Sales 运行与控制	任务接收、客户边界、当前任务读取许可	SG2.4 已完成数据库控制查询及本地 / CI 验证；未上线。
Sales 内容与 Resend	研究需求、草稿、附件、联系人 / 邮件工具	自动准备、草稿和受控发送完整闭环仍未接完。
人：企微 / 网页审批	改稿、批准、暂停、接管	目标入口已讨论；具体身份、控制和发送 UI 属后续模块。

仍然保留的业务顺序

- 普通咨询先回答和澄清。型号没定但有采购意图也可引导，不能只以“选定一个产品”为线索门槛。
- 买家明确确认提交必要信息后才成为正式询盘。三个官网入口统一交接，不要求销售再下“开始处理”的指令。
- 服务器自动核验来源和签发 task/run 授权；Sales 再读取资料、生成邮件和附件，通知人审核。
- 官网询盘和主动陌生获客分开。Resend 承载询盘邮件 / 维护，Apollo 对应主动开发；共用底座不代表混用报价或模板。
- 批准绑定任务、收件人及内容附件版本；改稿、来信、暂停会使旧批准失效。最终发送能力还要独立实现和验收。

注意：Phase 2 的旧 Stage E 曾建议 IMAP / SMTP 邮件方案；后续讨论已转为复用 Resend 与 Hermes Sales。不能把旧邮件方案和新方案并行各做一套。

建议下一轮先验收什么

工程建议，未在本轮改代码或执行上线

顺序	先交付的结果	验收要点
P0 可用性与反馈	定位 BFF / DB / worker / KB 当前故障；提交即有状态，截止、取消、重试和降级清楚	每个问题都有回答、澄清、拒答或可重试故障之一；无静默卡住，保留问题。
P1 已有修复和会话	复核 PR #59 并补足缺口，不盲目整体合并；修近期上下文、回答归属、历史恢复	短问、长对话、刷新、关闭重开、错误后继续问都能走通。
P2 产品与工具	复用公开产品 API / 批准详情，接有限循环、卡片、比较和询盘预填	模糊采购→澄清→找产品→比较→客户确认提交，数字不由模型编。
P3 外部检索与后台闭环	受控网页工具；独立推进 Channel 来源签发和 Hermes Sales / Resend 审核发送	外部资料清楚标注；跨客户、暂停、旧批准和重复发送测试通过后再启用。

本次核对依据

主干代码 b3d63ac1

Phase 2 PR #59（OPEN，a7e16aa2）

Phase 2 PLAN / SPEC / TECH-REVIEW / ADR-003

Hermes SG2.4 对应代码 CI

Anthropic：Building effective agents

OWASP：Prompt Injection

同时读取：主干 AssistantWidget、BFF、worker、上下文查询、grounding policy；Phase 2 交付与客户答复；当前 Sales 计划与 SG2.4 记录。实际页面与静态资源检查、健康探测记录随材料保存。

证据边界：未读取生产私网日志、知识库最新文档清单或客户账号配置。主干 SHA 不等同于线上后端发布 SHA。旧文档的“5 份资料 / 128 件产品”等数字只是历史快照，本报告不把它们当作今天的盘点。
